



UNIONE EUROPEA



COMUNE DI RAVANUSA



REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAVANUSA

### “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LOTTO C DELLA ZONA SUD/EST DELL'ABITATO”

# ELABORATI

PROGETTO DEFINITIVO

Ravanusa, 29/06/2020

aggiornato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

revisionato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- 1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 2. RELAZIONE DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE
- 3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 4. PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- 5. PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
- 6. RELAZIONE DI PREDIMENSIONAMENTO STATICO
- 7. RELAZIONE DI PREDIMENSIONAMENTO GEOTECNICO
- 8. RELAZIONE DI PREDIMENSIONAMENTO IDROLOGICO-IDRAULICO
- 9. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
- 10. DISEGNI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 11. ANALISI PREZZI UNITARI
- 12. ELENCO PREZZI UNITARI
- 13. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 14. INCIDENZA MANODOPERA
- 15. CRONOPROGRAMMA
- 16. PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA
- 17. DISCIPLINARE TECNICO
- 18. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
- 19. SCHEMA COMPETENZE TECNICHE
- 20. RELAZIONE GEOLOGICA

IL PROGETTISTA  
*(Ing. Vittorio Giarratana)*




IL RESP. UNICO PROC.  
*(Arch. Sebastiano Alesci)*

Spazio riservato per approvazioni o eventuali visti

Visto per il Comune

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	01/12/2020	02/12/2020	1
2	B	Approntamento aree di cantiere	02/12/2020	09/12/2020	7
3	C.1	Esecuzione accessi alle aree cantiere	09/12/2020	18/12/2020	9
4	C.2	Realizzazione operazioni di scavo e sbancamenti	18/12/2020	17/01/2021	30
5	C.3	Realizzazione paratie di consolidamento	17/01/2021	18/03/2021	60
6	C.4	Realizzazione ripristini sottoservizi	18/03/2021	17/04/2021	30
7	C.5	Realizzazione ripristino opere smaltimento idrico urbano	17/04/2021	16/06/2021	60
8	C.6	Realizzazione scavi per regimentazione acque meteoriche	16/06/2021	16/07/2021	30
9	C.7	Realizzazione condutture	16/07/2021	14/09/2021	60
10	C.8	Realizzazione opere di ripristino viario	14/09/2021	14/10/2021	30
11	C.9	Realizzazione opere di pavimentazione stradale	14/10/2021	04/11/2021	21
12	C.10	Esecuzione opere di finitura e rivestimenti vari aree urbane	04/11/2021	25/11/2021	21
13	D	Opere di ripristino luoghi e smobilizzo aree cantieri	25/11/2021	30/11/2021	5
14	E	Fine lavori	30/11/2021	01/12/2021	1

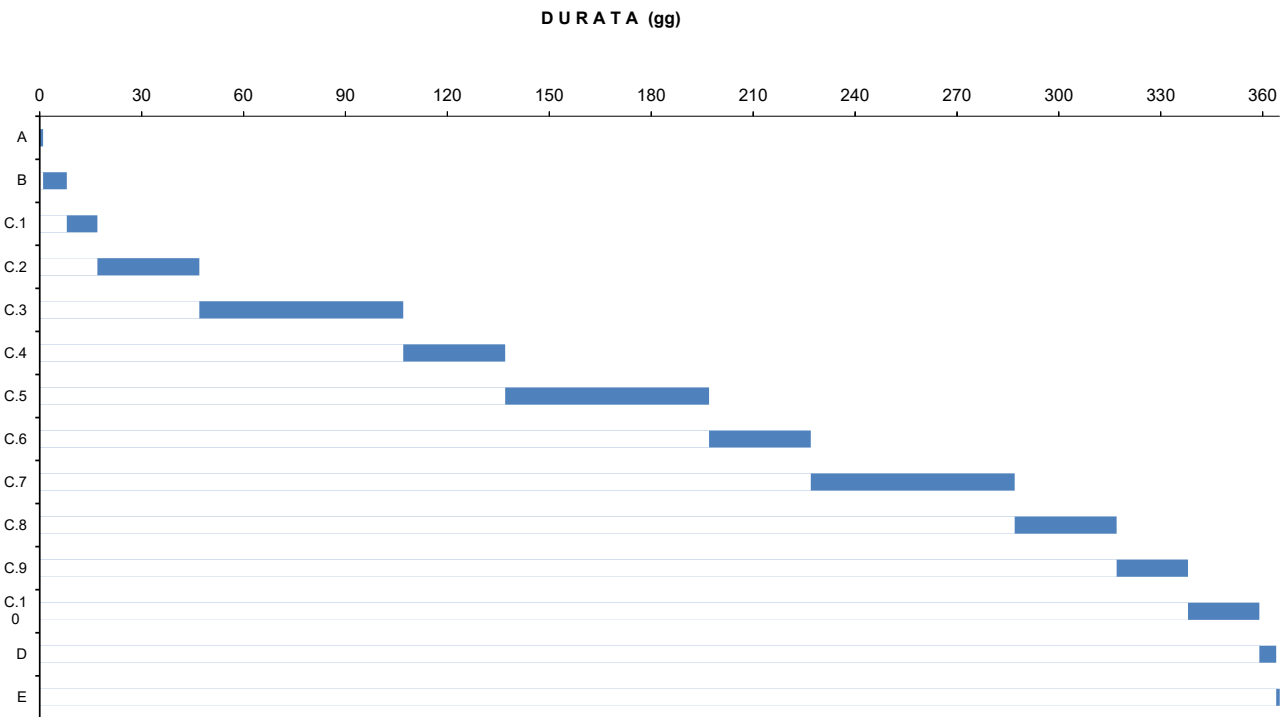

Inizio dei lavori

Fine lavori

TC

365

gg.

naturali consecutivi
