



Comune di RAVANUSA

Provincia AG

CRONOPROGRAMMA

LAVORI

Lavori di realizzazione dei loculi in via SAN GIACOMO con struttura prefabbricata in c.a.v. da eseguirsi presso il cimitero comunale di via Olimpica - DRA n. 1074 del 12/11/2019

COMMITTENTE COMUNE DI RAVANUSA (AG)
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

RUP Arch. ALESCI SEBASTIANO

IL RUP

TECNICO Arch. TRICOLI SALVATORE

IL TECNICO

Data 03/02/2020



CRONOPROGRAMMA


Prog. CME	DESCRIZIONE	IMPORTO	DURATA
	0 Apprestamento cantiere		1
31 > 1	Estumulazioni e ritumulazioni (fase preventiva)	€ 20.009,60	29
	1 Rimozione alberature	€ 277,44	1
	2 Rimozione asportazione ceppaie	€ 561,60	1
	3 Fondazione stradale	€ 417,69	1
	4 Compattazione fondo stradale	€ 7,65	1
	5 Taglio pavimentazione	€ 217,20	1
	6 Scarificazione	€ 648,65	1
	7 Conglomerato bituminoso	€ 1.075,03	1
8	Demolizione tramezzi	€ -	0
	9 Demolizione solette	€ 130,38	1
	10 Scavo a sezione obbligata	€ 1.912,53	3
	11 Trasporto materiale	€ 1.302,08	3
	12 Conglomerato cementizio magrone	€ 919,16	3
	13 Conglomerato cementizio basamento	€ 10.540,86	7
	14 Casseformi	€ 265,88	5
	15 FPO rete di acciaio basamento	€ 1.336,60	2
	16 Acciaio per basamento	€ 8.479,52	7
	17 FPO loculi prefabbricati in c.a.v.	€ 82.026,00	25
	18 FPO pre-tappo loculi in c.a.v.	€ 7.413,00	2
	19 FPO ossari prefabbricati in c.a.v.	€ 24.110,40	5
	20 FPO pre-tappo ossari in c.a.v.	€ 3.163,20	2
	21 FPO di copertura loculo in c.a.v.	€ 19.767,60	4
	22 FPO di copertura ossario in c.a.v.	€ 7.907,04	4
	23 Intonaco civile per esterni	€ 3.547,25	5
	24 FPO lastre di marmo	€ 31.344,47	10
	25 Taglio a sezione obbligata muratura	€ 1.277,99	2
	26 FPO di grondaia	€ 3.505,82	3
	27 FPO di pluviale	€ 1.167,31	1
	28 FPO di spianata di malta impermeabilizzazione	€ 1.078,46	3
	29 FPO impermeabilizzazione	€ 3.184,27	5
	30 FPO impermeabilizzazione	€ 2.479,28	5
31 > 1			
32	Ponteggio mobile	€ 136,12	1
33 > 3	Demolizione loculi esistenti	€ 9.998,35	14
34 > 18	Linea vita orizzontale	€ 966,60	x
35 > 19	Ancoraggio intermedio	€ 497,08	x
36 > 20	Cavo per kit linea vita	€ 925,42	x
	37 Ripiegamento cantiere		1
		TOTALE LAVORI € 252.597,53	160 GG LAV.

CALCOLO GIORNI

€ 31.294,55	Incidenza Manod'opera	
2	N° Operai	IL R.U.P. (Arch. Sebastiano Alesci)
€ 26,91	Costo medio orario	
8	N° Ore al giorno	
73	DURATA CANTIERE in giorni consecutivi	
7	Arrotond. X Imprevisti, maltempo, ecc.	
16,07	Giorni Tabellati lavorativi al mese	IL TECNICO (Arch. Salvatore Tricoli)
Mesi	4,98	5 N° MESI in c.t.
U.G.	160	

SVILUPPO ECONOMICO DI OGNI LAVORAZIONE


Lavori di realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.a.v. da eseguirsi presso il cimitero comunale di via Olimpica - DRA n. 1074 del 12/11/2019

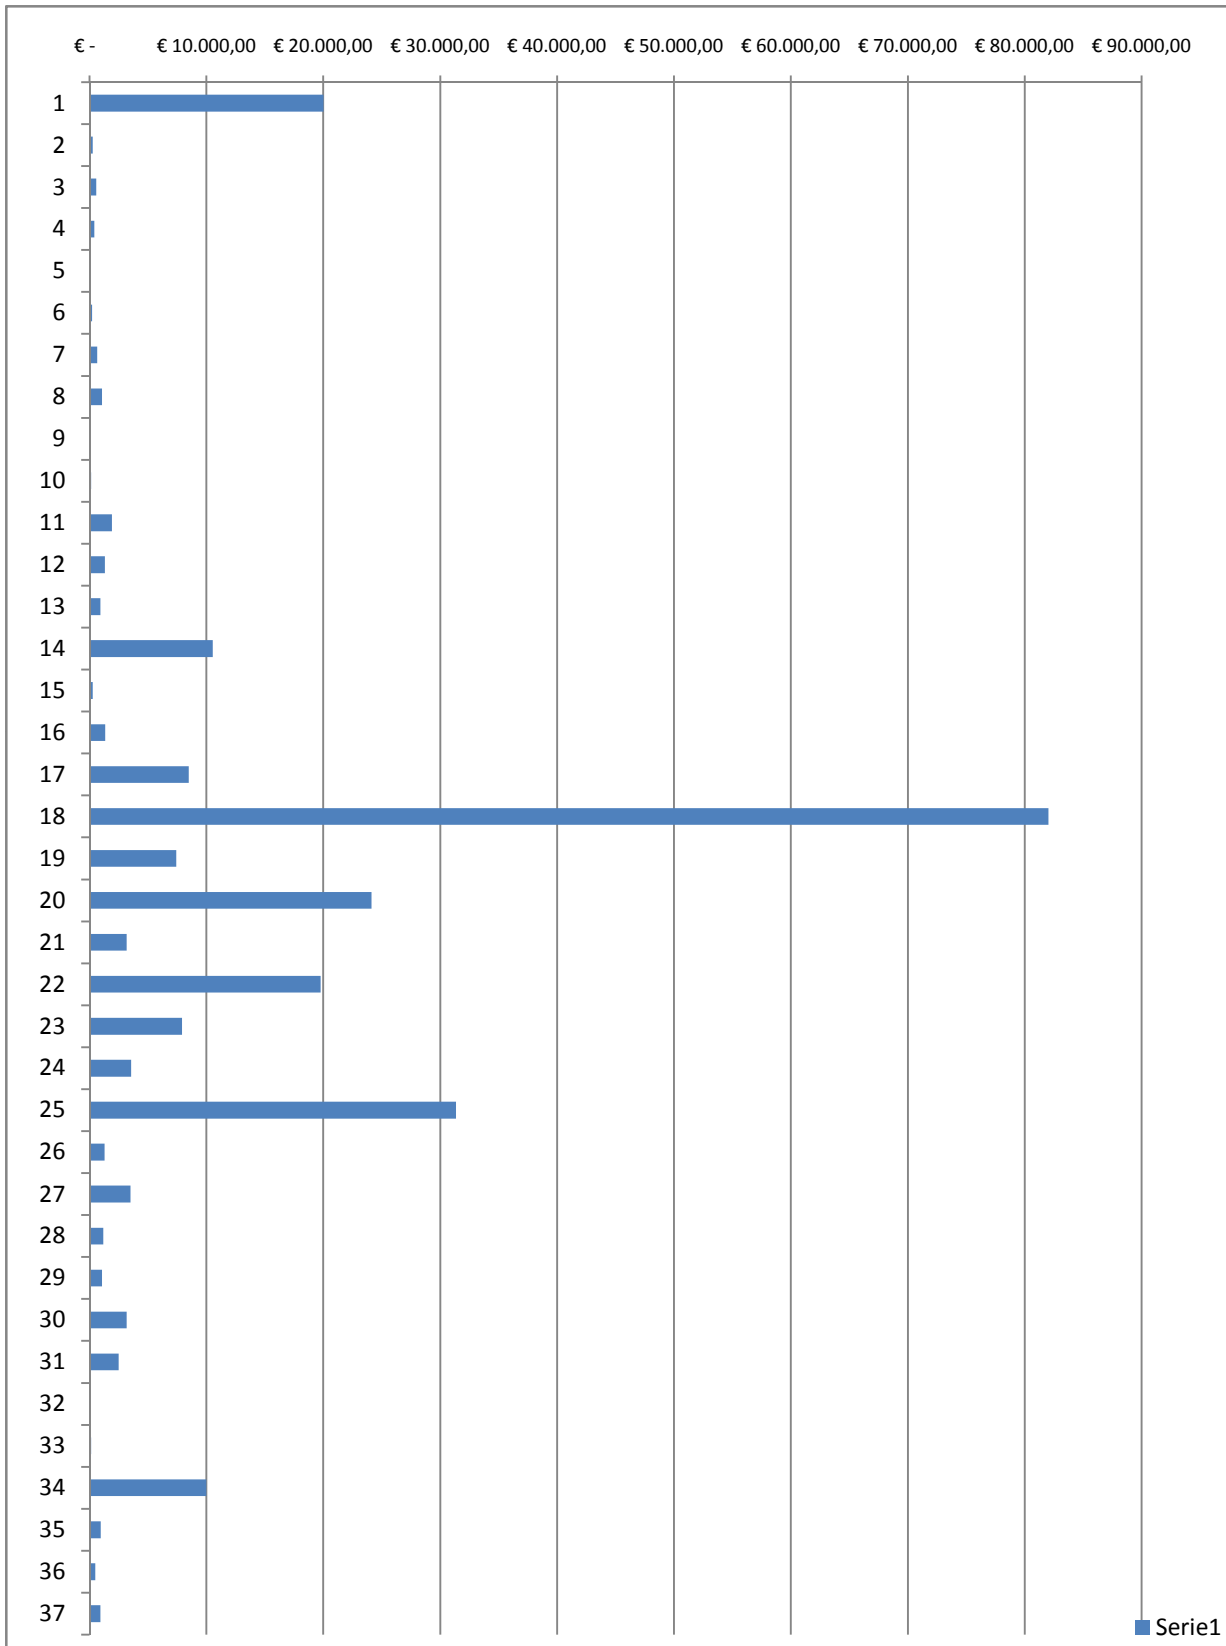

IL R.U.P.
(Arch. Sebastiano Alessi)

IL TECNICO
(Arch. Salvatore Tricoli)

SVILUPPO TEMPORALE

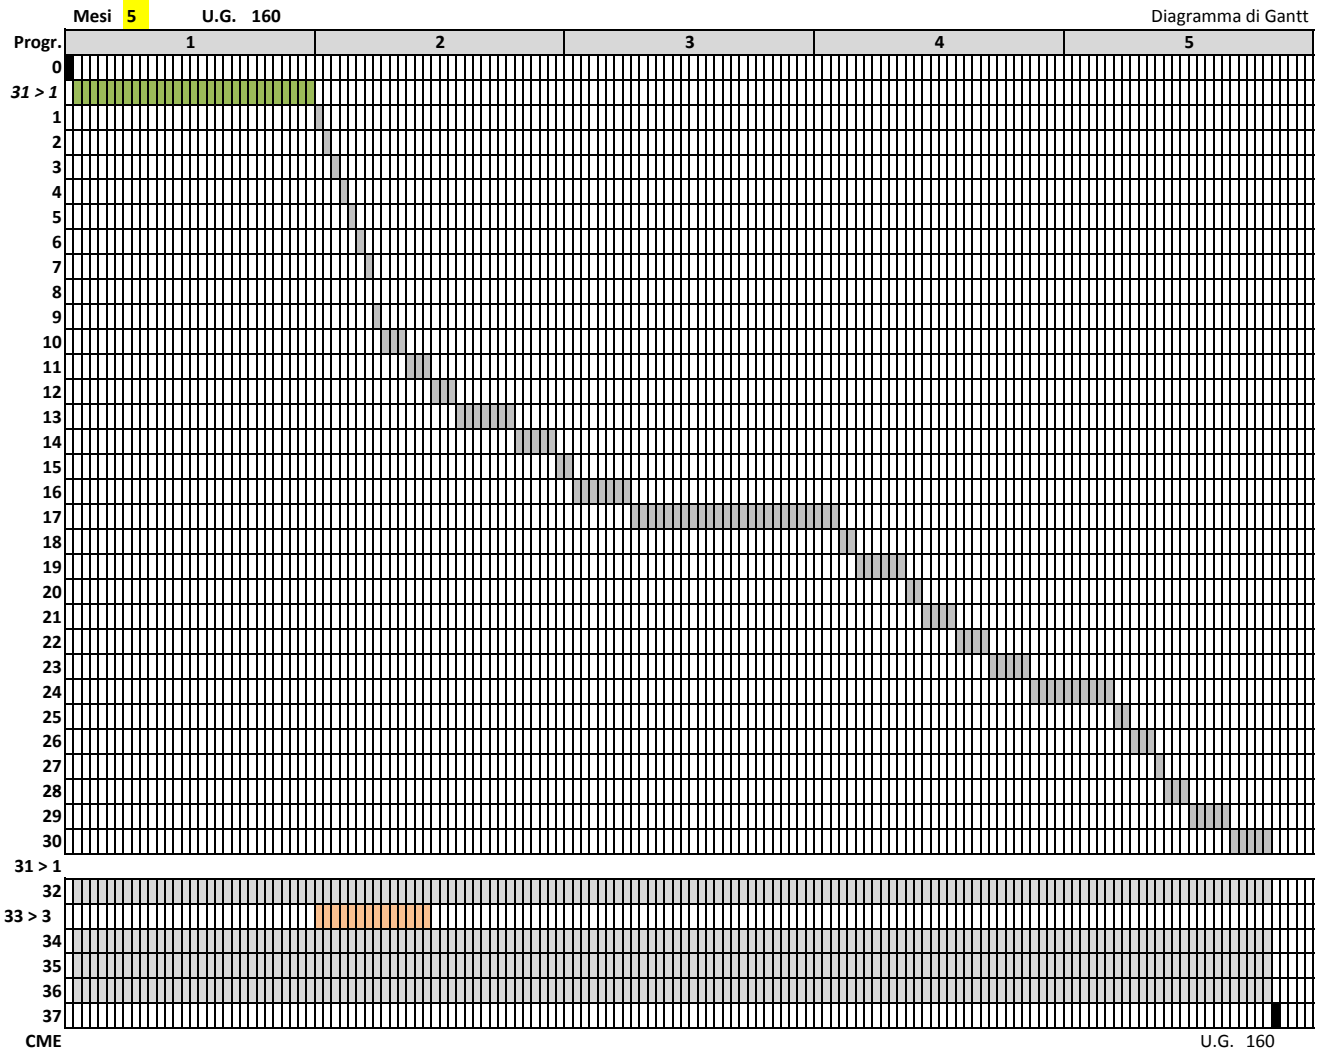

IL R.U.P.
(Arch. Sebastiano Alesci)

IL TECNICO
(Arch. Salvatore Tricoli)
